

## مطالعه یکپارچه پتانسیل معدنی محدوده طارم سفلی

تلفیق داده‌های سنجش‌ازدور، زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوابرد، گسل‌ها، اندیس‌ها و محدوده‌های معدنی برای شناسایی و اولویت‌بندی مناطق امیدبخش، همراه با کنترل میدانی اهداف

|                                          |          |                                                     |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| تهیه‌کننده                               | تاریخ    | مبنای قیمت                                          |
| شهاب خوشابی، کارشناس ارشد<br>مهندسی معدن | مهر ۱۴۰۵ | تعرفه خدمات زمین‌شناسی و اکتشاف<br>معدنی ۱۴۰۴ + ۳۰٪ |
| اعتبار پیشنهاد                           |          |                                                     |
| ۳۰ روز از تاریخ ارائه                    |          |                                                     |

### خلاصه پیشنهاد


این پیشنهاد مطالعه پتانسیل معدنی محدوده‌ای به وسعت ۲,۶۰۷ کیلومترمربع در مرز استان‌های قزوین، زنجان و گیلان را پوشش می‌دهد. کار در دو بخش انجام می‌شود: بخش دفتری که داده‌های موجود را گردآوری، پردازش و تلفیق می‌کند و نقشه پتانسیل و فهرست رتبه‌بندی‌شده اهداف را می‌سازد، و بخش میدانی که اهداف امیدبخش را با دو اکیپ کنترل می‌کند و رتبه‌بندی را بر اساس مشاهدات زمینی اصلاح می‌کند.

| وسعت محدوده           | مدت اجرا | عملیات میدانی | مبلغ کل (میلیارد تومان) |
|-----------------------|----------|---------------|-------------------------|
| ۲,۶۰۷ km <sup>2</sup> | ۲۶ هفته  | ۱۵۳ اکیپ-روز  | ۳۵,۸۴                   |

مبلغ کل بدون مالیات بر ارزش افزوده است. همه ارقام مالی این سند به میلیون تومان است مگر خلاف آن ذکر شود.

## ۲ محدوده مطالعاتی

محدوده یک چهارضلعی با مرکز تقریبی ۴۹/۰۵ درجه شرقی و ۳۶/۶۲ درجه شمالی است که مرکز آن در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین قرار دارد. محدوده تقریباً به طور کامل در برگه ۱:۲۵۰,۰۰۰ زنجان (NJ-39-13) و در سه برگه ۱:۱۰۰,۰۰۰ طارم، رودبار و ابهر واقع است.

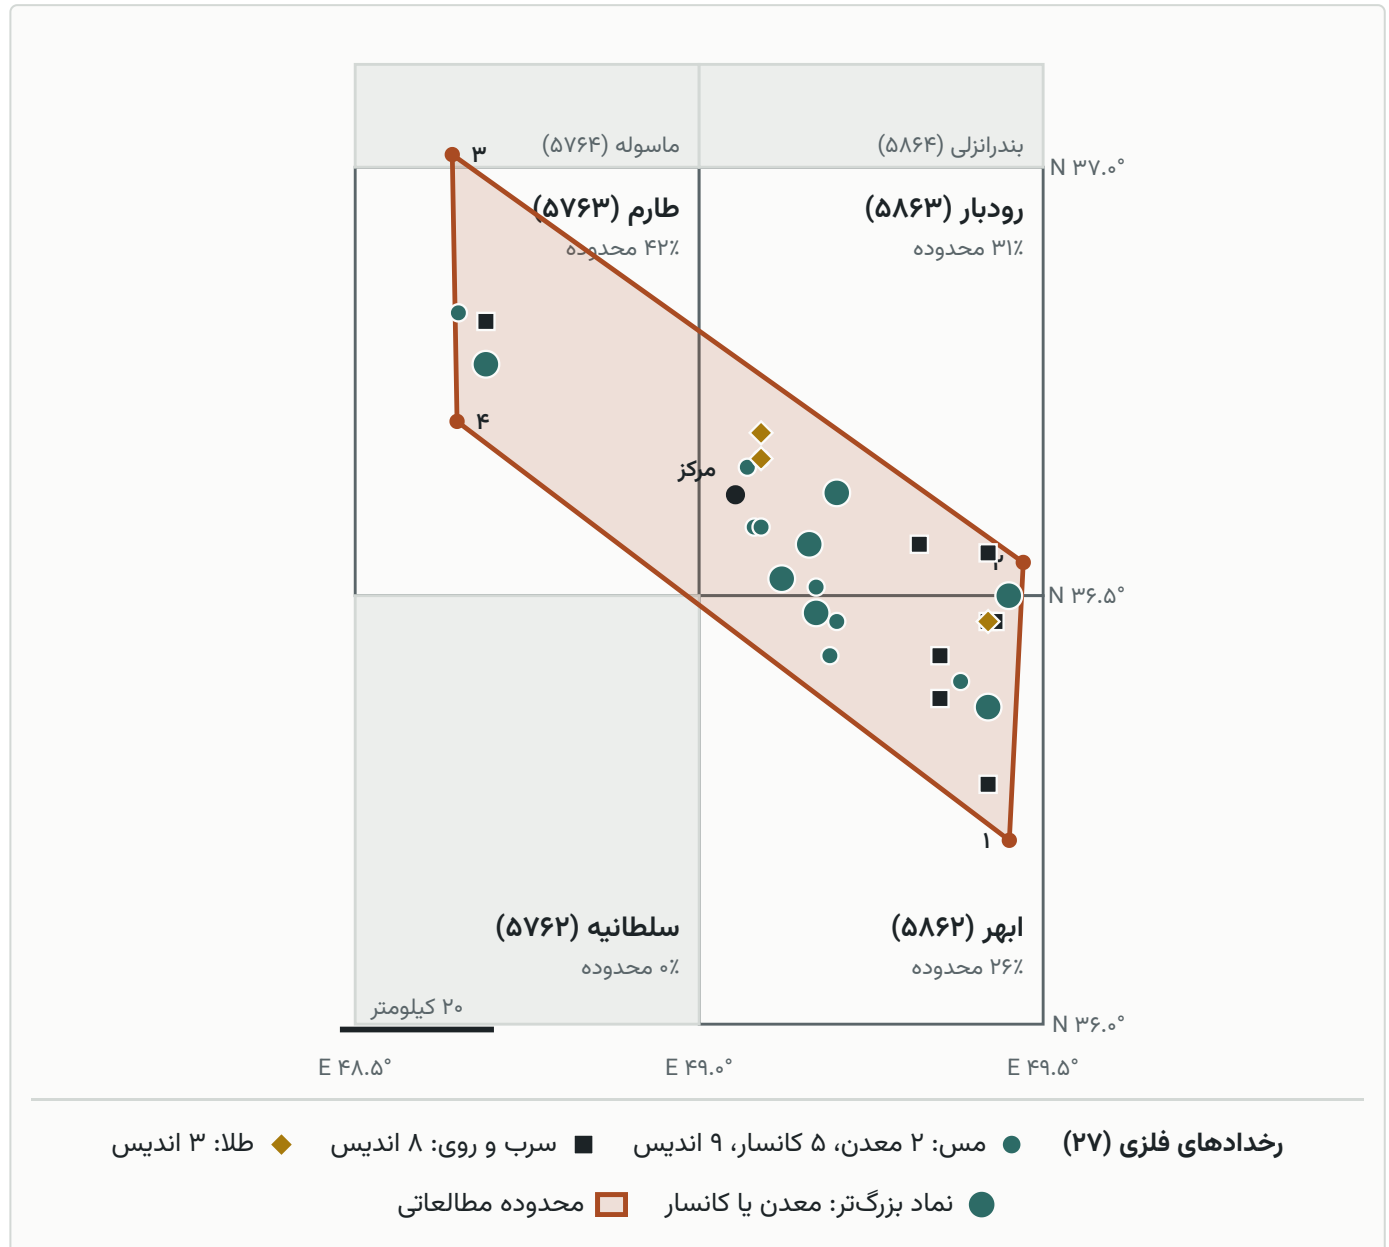


شکل ۱. موقعیت محدوده (چندضلعی نارنجی) روی شبکه برگه‌های ۱:۱۰۰,۰۰۰ زمین‌شناسی و رخدادهای فلزی شناخته‌شده. درصدها سهم هر برگه از مساحت محدوده است. دایره: مس، مربع: سرب و روی، لوزی: طلا؛ نماد بزرگتر: معدن یا کانسار.

| رأس | (E) طول جغرافیایی | (N) عرض جغرافیایی | UTM X (39N) | UTM Y (39N) |
|-----|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| ۱   | ۴۹,۴۵۰۹           | ۳۶,۲۱۴۵           | ۳۶۰,۷۶۲     | ۴,۰۰۸,۸۵۴   |
| ۲   | ۴۹,۴۷۱۲           | ۳۶,۵۳۸۸           | ۳۶۳,۱۵۰     | ۴,۰۴۴,۷۹۸   |
| ۳   | ۴۸,۶۴۱۲           | ۳۷,۰۱۴۷           | ۲۹۰,۱۴۴     | ۴,۰۹۹,۱۰۵   |
| ۴   | ۴۸,۶۴۸۰           | ۳۶,۷۰۳۵           | ۲۸۹,۸۹۸     | ۴,۰۶۴,۵۵۸   |


### ۳ داده‌های پایه

پوشش داده‌ها از برخورد چندضلعی محدوده با ایندکس برگه‌ها و صحنه‌های ماهواره‌ای به دست آمده است. دسترسی به داده‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوابرد از طریق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تأمین و پیش از شروع کار تأیید می‌شود.

| داده                                             | مقیاس / سنجنده                    | تعداد   | برگه ها / صحنه ها                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>نقشه های زمین شناسی</b>                       |                                   |         |                                                                                                                                                       |
| نقشه زمین شناسی                                  | ۱:۲۵۰,۰۰۰                         | ۱       | زنجان ۱۳-۳۹-NJ (حدود ۱۰۰٪ محدوده)                                                                                                                     |
| نقشه زمین شناسی                                  | ۱:۱۰۰,۰۰۰                         | ۳       | طارم ۵۷۶۳ (۴۲٪)، رودبار ۵۸۶۳ (۳۱٪)، ابهر ۵۸۶۲ (۲۶٪)                                                                                                   |
| شبکه برگه های زمین شناسی                         | ۱:۲۵,۰۰۰                          | ۲۹      | برگه های شبکه ملی در محدوده؛ از برگه های منتشر شده هر کدام موجود باشد استفاده می شود                                                                  |
| <b>ژئوشیمی و ژئوفیزیک</b>                        |                                   |         |                                                                                                                                                       |
| ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای                         | ۱:۱۰۰,۰۰۰                         | ۳       | برگه های طارم، رودبار و ابهر                                                                                                                          |
| ژئوفیزیک هوابرد<br>(مغناطیس سنجی و<br>رادیومتری) | ۱:۲۵۰,۰۰۰                         | ۱       | بلوک زنجان                                                                                                                                            |
| <b>داده های ماهواره ای (بدون هزینه خرید)</b>     |                                   |         |                                                                                                                                                       |
| ASTER L1B (VNIR, SWIR, TIR)                      | ۶۰×۶۰ km                          | ۴       | حداقل تعداد صحنه برای پوشش کامل؛ ۷ صحنه آرسنوی محدوده را قطع می کنند                                                                                  |
| Sentinel-2 MSI                                   | کاشی MGRS                         | ۲       | T39SUA (۸۷٪)، T39STA (۱۳٪)                                                                                                                            |
| Landsat 8/9 OLI                                  | WRS-2                             | ۲       | گذر ۱۶۶ ردیف ۳۴ (۷۸٪)، گذر ۱۶۶ ردیف ۳۵ (۲۲٪)                                                                                                          |
| مدل رقومی ارتفاع                                 | ۳۰ متر                            | —       | برای خطواره ها و تحلیل توپوگرافی                                                                                                                      |
| <b>سایر لایه ها</b>                              |                                   |         |                                                                                                                                                       |
| اندیس ها، کانسارها و معادن<br>فلزی               | جداول پیوست کتاب فیضی<br>و خوشابی | ۲۷      | جزئیات در بخش ۳/۱                                                                                                                                     |
| محدوده های کاداستر معدنی                         | سامانه کاداستر معادن              | استعلام | درخواست اکتشاف، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری، مجوز برداشت و محدوده های مزایده؛ پیش از شروع کار استعلام و به پایگاه داده افزوده می شود |
| گسل ها و ساختارهای اصلی از نقشه های زمین شناسی   |                                   |         |                                                                                                                                                       |

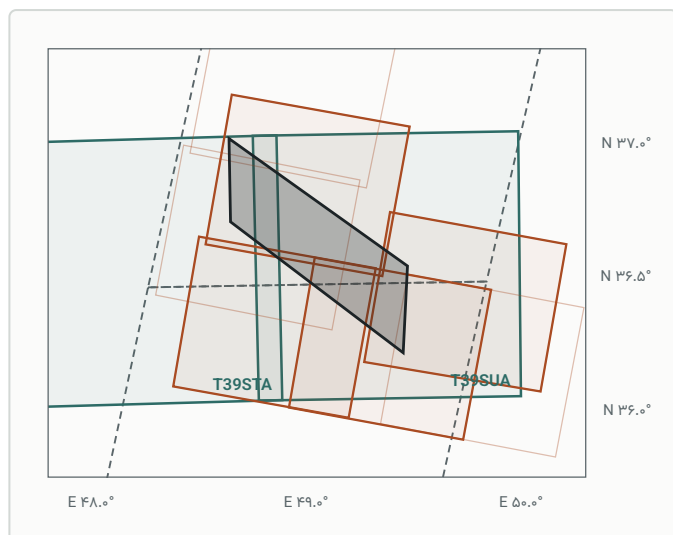

شکل ۳. پوشش داده‌های ماهواره‌ای. محدوده: خاکستری تیره؛ نارنجی پررنگ: ۴ صحنه ASTER انتخاب‌شده، نارنجی کم‌رنگ: سایر صحنه‌های آرشویی، سبز: کاشی‌های Sentinel-2، خط‌چین خاکستری: صحنه‌های Landsat گذر ۱۶۶.

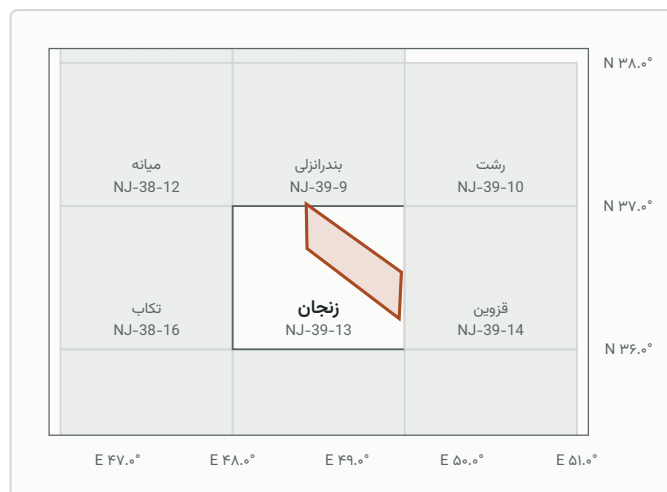

شکل ۲. محدوده روی شبکه برگه‌های ۱:۲۵۰,۰۰۰ زمین‌شناسی. محدوده به‌طور کامل در برگه زنگان (NJ-39-13) قرار دارد.

| تاریخ برداشت | صحنه ASTER انتخاب‌شده     |
|--------------|---------------------------|
| —            | ASTER1B_200801_368        |
| 08/Sep/02    | SC:AST_L1B.003:2008260332 |
| —            | ASTER1B_200801_363        |
| 12/Jul/01    | AST_L1B_003_2018256201    |

صحنه‌های ASTER از ایندکس آرشو صحنه‌ها انتخاب شده‌اند؛ در صورت پوشش ابر یا برف، صحنه جایگزین از همان گذر استفاده می‌شود.


### ۱,۳ اندیس‌ها و معادن شناخته‌شده در محدوده

در محدوده ۲۷ رخداد فلزی ثبت شده است: ۲ معدن، ۵ کانسار و ۲۰ اندیس. بیشتر آن‌ها مس و سرب‌روی رگه‌ای در سنگ‌های آتشفشانی ائوسن هستند و در سه گروه قرار دارند: جنوب‌شرق محدوده، بخش میانی و شمال‌غرب در برگه طارم. این رخدادها برای اعتبارسنجی مدل پتانسیل به کار می‌روند. ۱۳ رخداد دیگر در فاصله حدود ۵ کیلومتری مرز محدوده قرار دارند و در اعتبارسنجی لحاظ می‌شوند.

| ماده      | معدن | کانسار | اندیس | جمع |
|-----------|------|--------|-------|-----|
| مس        | ۲    | ۵      | ۹     | ۱۶  |
| سرب و روی | —    | —      | ۸     | ۸   |
| طلا       | —    | —      | ۳     | ۳   |
| جمع       | ۲    | ۵      | ۲۰    | ۲۷  |

## ۴ روش کار

کار از گردآوری و یکسان‌سازی داده‌ها شروع می‌شود، از تحلیل جداگانه هر لایه می‌گذرد و به یک مدل پتانسیل تلفیقی می‌رسد. اهداف حاصل از مدل در محل کنترل می‌شوند و نتیجه کنترل میدانی دوباره به رتبه‌بندی برمی‌گردد.

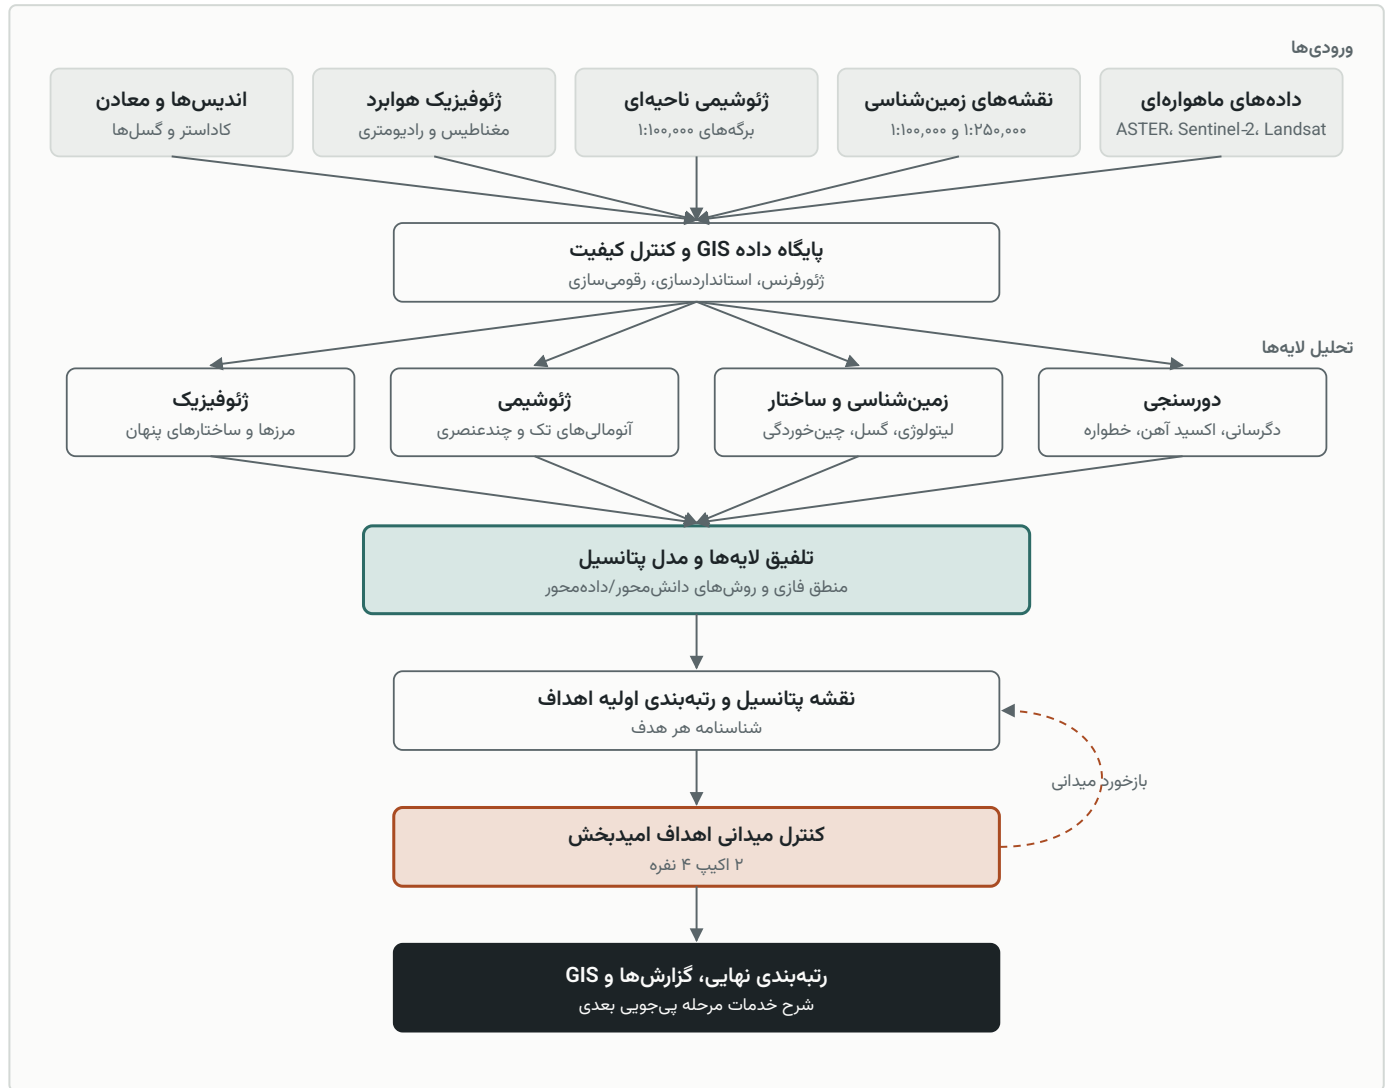

شکل ۴. روند اجرای مطالعه. خط‌چین نارنجی بازخورد نتایج کنترل میدانی به رتبه‌بندی اهداف است.

### سنجش‌ازدور

### زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک

- تصحیح رادیومتری و اتمسفری، موزاییک و برش محدوده
- نسبت‌های باندی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی و نقشه‌برداری
- طیفی روی ASTER برای دگرسانی آذرلیک، فلیک، پروپیلیتیک و سیلیسی
- نقشه اکسیدهای آهن از Landsat و Sentinel-2
- استخراج خطواره‌ها از مدل رقومی ارتفاع و تصاویر
- رقومی‌سازی و یکسان‌سازی واحدهای سنگی و گسل‌ها
- جداسازی آئومالی‌های تک‌عنصری و چندعنصری ژئوشیمیایی
- تفسیر مغناطیس و رادیومتری هوابرد برای ساختارها و توده‌های پنهان
- ارائه مدل زایشی تیپ‌های کانه‌زایی مورد انتظار

## تلفیق و رتبه‌بندی

## کنترل میدانی

- تبدیل هر لایه به لایه شاهد بر اساس مدل زایشی
- تلفیق با منطق فازی و روش‌های دانش‌محور و داده‌محور
- اعتبارسنجی مدل با اندیس‌ها و معادن شناخته‌شده
- رتبه‌بندی اهداف و تهیه شناسنامه برای هر هدف
- دو اکیپ ۴ نفره: کارشناس خبره، کارشناس همراه، راننده، کارگر
- بازدید فقط از اهداف امیدبخش حاصل از مدل
- ثبت مختصات، عکس و توصیف رخنمون، دگرسانی و کانه‌زایی
- اصلاح رتبه‌بندی بر اساس مشاهدات زمینی

## ۴,۱ چرا تلفیق؟

بدون مدل تلفیقی، دو راه برای بازدید میدانی وجود دارد. جدول زیر این دو راه را با روش پیشنهادی مقایسه می‌کند. مبالغ به میلیارد تومان و با نرخ‌های همین پیشنهاد محاسبه شده‌اند.


| روش                                   | اکیپ-روز | زمان کل                        | مبلغ      | نتیجه                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بازدید تک‌به‌تک ۲۷ رخداد شناخته‌شده   | حدود ۴۰  | ۲ تا ۲/۵ ماه                   | حدود ۶/۱  | فقط رخدادهای از پیش معلوم بازبینی می‌شوند و هدف جدیدی شناسایی نمی‌شود.                                                  |
| بازدید سیستماتیک کل ۲,۶۰۷ کیلومترمربع | حدود ۲۶۰ | حدود ۷ ماه، بدون احتساب زمستان | حدود ۳۷/۹ | بیشتر وقت اکیپ‌ها صرف مناطق بدون پتانسیل می‌شود و داده‌های دورسنجی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک به کار نمی‌روند.                 |
| روش پیشنهادی: تلفیق و بازدید هدفمند   | ۱۵۳      | ۶ ماه                          | ۳۵/۸      | کل محدوده با داده پوشش داده می‌شود، اهداف جدید شناسایی و رتبه‌بندی می‌شوند و فقط اهداف امیدبخش در میدان بازدید می‌شوند. |

مبنای برآورد: برای هر معدن یا کانسار ۲ روز و برای هر اندیس ۱ روز بازدید به علاوه ۲۰٪ برای جابه‌جایی؛ در بازدید سیستماتیک، پوشش حدود ۱۰ کیلومترمربع در هر اکیپ-روز در منطقه کوهستانی. هر دو روش شامل گزارش کنترل میدانی، گزارش پایانی و پایگاه GIS است.

## ۵ برنامه زمانی

دو برنامه پیشنهاد می‌شود. برنامه پایه با دو اکیپ میدانی ۲۶ هفته (۶ ماه) از امضای قرارداد طول می‌کشد. برنامه تسریع‌شده با سه اکیپ میدانی همان ۱۵۳ اکیپ-روز را در ۲۰ هفته انجام می‌دهد. در هر دو برنامه کار دفتری تا هفته ۹ به فهرست اولیه اهداف می‌رسد و عملیات میدانی از هفته ۱۰ شروع می‌شود.

## ۵,۱ برنامه پایه: ۲ اکیپ، ۲۶ هفته

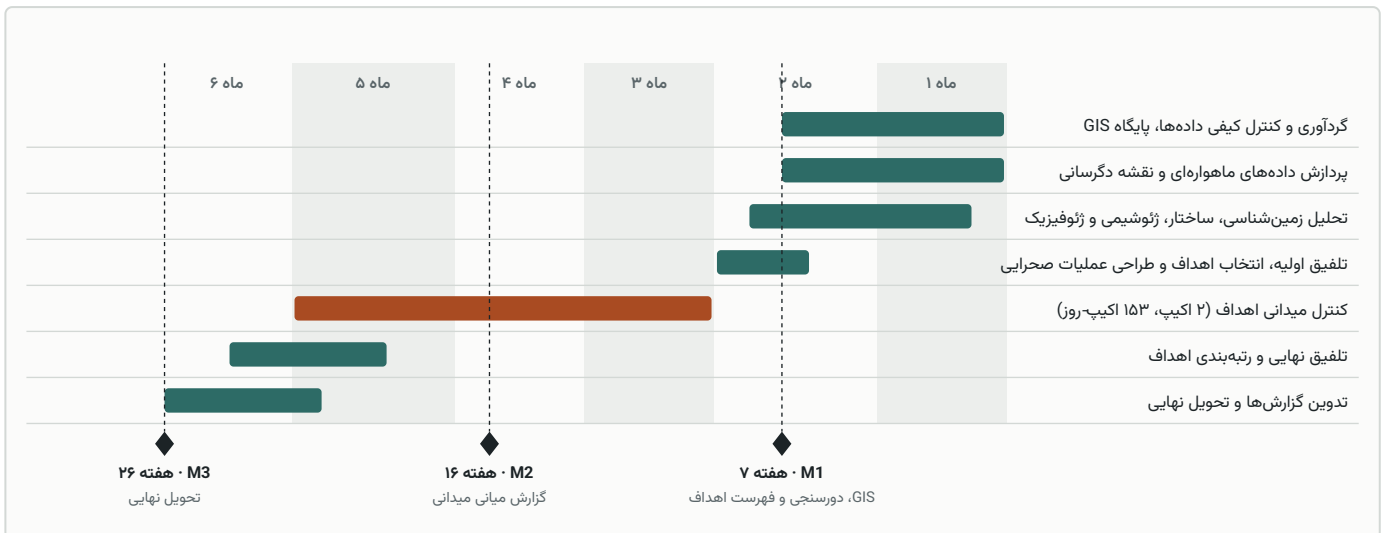

شکل ۵. برنامه پایه به تفکیک هفته. سبز: کار دفتری، نارنجی: کار میدانی. M1 تا M3 نقاط تحویل و پرداخت‌اند.

## ۵,۲ برنامه تسریع‌شده: ۳ اکیپ، ۲۰ هفته



شکل ۶. برنامه تسریع‌شده. با سه اکیپ، کنترل میدانی از ۱۳ هفته به حدود ۹ هفته کاهش می‌یابد.

| گزینه     | اکپ | اکپ-روز | مدت میدانی | مدت کل  | مبلغ کل  |
|-----------|-----|---------|------------|---------|----------|
| پایه      | ۲   | ۱۵۳     | ۱۳ هفته    | ۲۶ هفته | ۳۵,۸۴۴/۷ |
| تسریع‌شده | ۳   | ۱۵۳     | ۹ هفته     | ۲۰ هفته | ۳۵,۹۱۰/۷ |

چون مبلغ میدانی بر اساس اکپ-روز است، تعداد اکپ‌ها مبلغ را تغییر نمی‌دهد. تنها افزایش در گزینه تسریع‌شده حدود ۶۶ میلیون تومان است: اعزام اولیه اکپ سوم (ردیف ۱۰۱۰۲) و تعدیل ردیف‌هایی که به مبلغ کل وابسته‌اند.

بخش‌های مرتفع محدوده در زمستان برف‌گیرند. اگر شروع عملیات میدانی به ماه‌های سرد بیفتد، ابتدا نواحی کم‌ارتفاع دره سفیدرود و طارم بازدید می‌شوند و بقیه به بهار منتقل می‌شود. در این حالت مدت کل برنامه پایه به ۷ تا ۸ ماه می‌رسد، بدون تغییر در مبلغ.



| تحویل | محتوا                                                                                                                                            | برنامه پایه   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| M1    | پایگاه داده GIS، نقشه‌های دگرسانی و خطواره، لایه‌های تحلیلی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک، فهرست اولیه اهداف و برنامه عملیات صحرایی             | پایان هفته ۷  |
| M2    | گزارش میانی کنترل میدانی شامل نتایج بازدید اهداف تا آن تاریخ                                                                                     | هفته ۱۶       |
| M3    | نقشه پتانسیل نهایی، جدول رتبه‌بندی و شناسنامه اهداف، گزارش کنترل میدانی، مدل زایشی، گزارش پایانی فاز، شرح خدمات مرحله پی‌جویی و همه فایل‌های GIS | پایان هفته ۲۶ |

ارقام از ردیف‌های «تعرفه خدمات زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی سال ۱۴۰۴» (تهیه‌شده با همکاری ایمیدرو، وزارت صمت و جامعه مهندسان مشاور ایران) با ۳۰٪ افزایش برای سال ۱۴۰۵ محاسبه شده‌اند. نرخ‌ها به میلیون تومان است.

۷،۱ ردیف‌های دفتری فصل‌های اول و ششم تعرفه

| ردیف                                 | شرح                                           | واحد                | نرخ ۱۴۰۴ | نرخ ۱۴۰۵ | مقدار | n1 | مبلغ    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------|----|---------|
| ۰۱۰۱۰۱                               | جمع‌آوری و رقوم‌سازی اطلاعات                  | طبق فرمول           | —        | —        | ۱     | —  | ۲۴۷/۳   |
| ۰۱۰۴۰۱                               | سازماندهی و طراحی عملیات صحرایی و گزارش       | ۱۰۰ km <sup>2</sup> | ۴۳/۰     | ۵۵/۹۰    | ۲۶/۰۷ | —  | ۱,۴۵۷/۳ |
| ۰۱۰۵۰۱                               | مطالعه گزارش‌ها و انتقال اطلاعات به نرم‌افزار | مقطوع               | ۶۰/۱     | ۷۸/۱۳    | ۱     | —  | ۷۸/۱    |
| ۰۶۱۶۰۱                               | پایگاه داده GIS فاز شناسایی                   | مقطوع               | ۱۱۵/۵۵   | ۱۵۰/۲۲   | ۱     | —  | ۱۵۰/۲   |
| ۰۶۰۱۰۱                               | ارائه مدل زایشی کانه‌زایی‌های مورد انتظار     | مقطوع               | ۱۱۱/۴    | ۱۴۴/۸۲   | ۱     | —  | ۱۴۴/۸   |
| ۰۶۰۱۰۲                               | تحلیل داده‌های زمین‌شناسی و ساختاری           | مقطوع               | ۱۱۱/۴    | ۱۴۴/۸۲   | ۱     | —  | ۱۴۴/۸   |
| ۰۶۰۱۰۳                               | تحلیل و یکپارچه‌سازی داده‌های ژئوشیمیایی      | مقطوع               | ۱۱۱/۴    | ۱۴۴/۸۲   | ۱     | —  | ۱۴۴/۸   |
| ۰۶۰۱۰۴                               | تحلیل داده‌های ژئوفیزیک هوابرد (مغناطیس‌سنجی) | مقطوع               | ۱۱۱/۴    | ۱۴۴/۸۲   | ۱     | —  | ۱۴۴/۸   |
| ۰۶۰۱۰۵                               | تحلیل داده‌های رادیومتری                      | مقطوع               | ۱۱۱/۴    | ۱۴۴/۸۲   | ۱     | —  | ۱۴۴/۸   |
| ۰۶۰۱۰۶                               | تحلیل داده‌های مغناطیس‌سنجی زمینی موجود       | مقطوع               | ۱۱۱/۴    | ۱۴۴/۸۲   | ۱     | —  | ۱۴۴/۸   |
| ۰۶۰۱۰۷                               | گزارش کنترل میدانی نواحی امیدبخش              | مقطوع               | ۱۱۱/۴    | ۱۴۴/۸۲   | ۱     | —  | ۱۴۴/۸   |
| ۰۶۰۱۰۸                               | شرح خدمات پی‌جویی و اکتشاف تفصیلی             | مقطوع               | ۱۵۲/۹    | ۱۹۸/۷۷   | ۱     | —  | ۱۹۸/۸   |
| ۰۶۱۳۰۱                               | گزارش پایانی فاز اکتشافی                      | مقطوع               | ۱۴۱/۹    | ۱۸۴/۴۷   | ۱     | —  | ۱۸۴/۵   |
| جمع ردیف‌های دفتری تعرفه‌ای          |                                               |                     |          |          |       |    |         |
| ۳,۳۲۹/۹                              |                                               |                     |          |          |       |    |         |
| ردیف‌های ستاره‌دار (توافقی)          |                                               |                     |          |          |       |    |         |
| ۰۱۰۲۰۱ *                             | پردازش و تفسیر داده‌های ماهواره‌ای            | km <sup>2</sup>     | *        | ≈ ۲/۳۶   | ۲,۶۰۷ | —  | ۶,۱۴۴/۸ |
| بند ۳-۵ *                            | تلفیق لایه‌ها، مدل پتانسیل و رتبه‌بندی اهداف  | مقطوع               | *        | —        | ۱     | —  | ۳,۰۷۲/۴ |
| بند ۳-۵ *                            | گزارش تلفیق و پتانسیل‌یابی                    | مقطوع               | *        | —        | ۱     | —  | ۱,۵۳۶/۲ |
| جمع ردیف‌های ستاره‌دار (۳۰٪ مبلغ کل) |                                               |                     |          |          |       |    |         |
| ۱۰,۷۵۳/۴                             |                                               |                     |          |          |       |    |         |
| جمع بخش دفتری                        |                                               |                     |          |          |       |    |         |
| ۱۴,۰۸۳/۳                             |                                               |                     |          |          |       |    |         |

| ردیف           | شرح                                                          | واحد     | نرخ ۱۴۰۴ | نرخ ۱۴۰۵ | مقدار | n1 | مبلغ     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|----|----------|
| ۰۲۰۹۰۱         | کنترل میدانی آتومالی‌ها و مناطق امیدبخش (نرخ پیشنهادی مشاور) | اکیپ-روز | ۳۹/۸۰    | ۱۰۰/۰۰   | ۱۵۳   | -  | ۱۵,۳۰۰/۰ |
| ۰۲۰۱۰۲         | خودرو دوکابین دو دیفرانسیل                                   | روز      | ۱۴/۱     | ۱۸/۳۳    | ۱۵۳   | ۱  | ۲,۸۰۴/۵  |
| ۰۲۰۲۰۱         | اسکان و تجهیز محل استقرار (تا ۴ نفر)                         | روز      | ۱۳/۴     | ۱۷/۴۲    | ۱۵۳   | ۱  | ۲,۶۶۵/۳  |
| ۰۲۰۱۰۱         | اعزام اولیه اکیپ و حمل وسایل                                 | هر بار   | ۳۵/۲۵    | ۴۵/۸۳    | ۲     | ۱  | ۹۱/۷     |
| تبصره فصل ۲    | اعزام مجدد اکیپ (تعداد دقیق پس از مرحله دفتری)               | هر بار   | -        | ۱۵۰/۰۰   | ۶     | -  | ۹۰۰/۰    |
| جمع بخش میدانی |                                                              |          |          |          |       |    | ۲۱,۷۶۱/۴ |

## ۷,۳ جمع کل

| بخش                                           | مبلغ     | سهم      |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| دفتری (تعرفه‌ای و ستاره‌دار)                  | ۱۴,۰۸۳/۳ | ۳۹/۳٪    |
| میدانی                                        | ۲۱,۷۶۱/۴ | ۶۰/۷٪    |
| مبلغ کل پیشنهادی (بدون مالیات بر ارزش افزوده) |          | ۳۵,۸۴۴/۷ |
|                                               |          | ۱۰۰٪     |

|            |           |
|------------|-----------|
| میدانی ۶۱٪ | دفتری ۳۹٪ |
|------------|-----------|

ارقام به یک رقم اعشار گرد شده‌اند و جمع ردیف‌ها ممکن است ۱٪ اختلاف داشته باشد.

■ دفتری: ۱۴/۰۸ میلیارد تومان ■ میدانی: ۲۱/۷۶ میلیارد تومان

## ۷,۴ مبنای محاسبه و ارجاع به بندهای تعرفه

- ضریب منطقه‌ای (بند ۳-۳ کلیات):  $n1 = (R - 1) \times 0.5 + 1.3$  با  $R = ۱/۱۱$  برای شهرستان قزوین،  $n1 = ۱/۳۵۵$ . این ضریب فقط روی ردیف‌های فصل‌های ۲ تا ۴ اعمال می‌شود؛ در این پیشنهاد فقط ردیف ۰۲۰۹۰۱ مشمول آن است و نرخ تعرفه‌ای آن با  $n1$  برابر ۷۰/۱ میلیون تومان در اکیپ-روز می‌شود. نرخ پیشنهادی مشاور برای این ردیف ۱۰۰ میلیون تومان در اکیپ-روز است.
- بند ۳ توضیحات فصل دوم: ضریب منطقه‌ای ردیف‌های اعزام (۰۲۰۱۰۱)، خودرو (۰۲۰۱۰۲) و اسکان (۰۲۰۲۰۱) برابر ۱ است.
- بند ۴ توضیحات فصل دوم: هر اکیپ-روز ردیف ۰۲۰۹۰۱ شامل ۴ نفر است: کارشناس خبره، کارشناس همراه، راننده و کارگر ساده.
- بند ۱ فصل اول: حق‌الزحمه ردیف ۰۱۰۱۰۱ از رابطه  $y = p1 \cdot x^2 + p2 \cdot x + p3$  با  $p1 = 1.479 \times 10^{-15}$ ،  $p2 = 0.005015$  و  $p3 = 406,800,000$  ریال (x: مبلغ قرارداد به نرخ ۱۴۰۴) محاسبه و سپس ۳۰٪ به آن افزوده شده است.
- بند ۳-۵ کلیات: خدماتی که در تعرفه ردیف ندارند (تلفیق، مدل پتانسیل و گزارش آن) مشابه ردیف‌های ستاره‌دار در نظر گرفته می‌شوند.
- بند ۳-۶ کلیات: مجموع ردیف‌های ستاره‌دار و ردیف‌های خارج از تعرفه حداکثر ۳۰٪ مبلغ کل قرارداد است. در این پیشنهاد این مجموع دقیقاً ۳۰٪ است.

- **ردیف ۰۶۱۶۰۱:** برای پهنه تا ۲,۵۰۰ کیلومترمربع در یک استان است. محدوده بین سه استان تقسیم شده و اضافه‌بهای ۳۰٪ ردیف ۰۶۱۶۰۵ منظور نشده است. اگر سهم یک استان از ۲,۵۰۰ کیلومترمربع بیشتر باشد، ۴۵/۱ میلیون تومان به این ردیف اضافه می‌شود.

## ۸ تعدیل روزهای میدانی

ردیف ۰۲۰۹۰۱ برای کنترل میدانی آنومالی‌ها و مناطق امیدبخش است و تعداد روزهای لازم به تعداد و وسعت اهدافی بستگی دارد که در پایان مرحله دفتری به دست می‌آید. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود ۱۵۳ اکپ-روز سقف قرارداد باشد و تعداد قطعی روزها و اعزام‌های مجدد در پایان مرحله دفتری (هفته ۹)، پس از تأیید فهرست اهداف توسط کارفرما، تعیین شود. مبلغ هر اکپ-روز با خودرو و اسکان ۱۳۵/۸ میلیون تومان و هر اعزام مجدد ۱۵۰ میلیون تومان است و ردیف‌های ستاره‌دار متناسب با مبلغ نهایی تعدیل می‌شوند تا در سقف ۳۰٪ بمانند.

| اکپ-روز | مدت میدانی با ۲ اکپ (روز کاری) | دفتری  | میدانی | مبلغ کل | سهم دفتری |
|---------|--------------------------------|--------|--------|---------|-----------|
| ۷۷      | حدود ۳۹                        | ۹,۲۷۸  | ۱۰,۸۴۴ | ۲۰,۱۲۲  | ۴۶/۱٪     |
| ۱۰۰     | ۵۰                             | ۱۰,۷۸۳ | ۱۴,۲۶۷ | ۲۵,۰۵۰  | ۴۳/۰٪     |
| ۱۲۰     | ۶۰                             | ۱۱,۹۷۸ | ۱۶,۹۸۲ | ۲۸,۹۶۰  | ۴۱/۴٪     |
| ۱۵۳     | حدود ۷۷                        | ۱۴,۰۸۳ | ۲۱,۷۶۱ | ۳۵,۸۴۵  | ۳۹/۳٪     |

تعداد اعزام‌های مجدد با روزهای میدانی تغییر می‌کند (۲ اعزام برای ۷۷ اکپ-روز، ۴ اعزام برای ۱۰۰ و ۱۲۰، و ۶ اعزام برای ۱۵۳ اکپ-روز). با کاهش روزهای میدانی، مدت کل پروژه هم کوتاه‌تر می‌شود؛ با ۷۷ اکپ-روز و دو اکپ حدود ۲۰ هفته.

## ۹ شرایط پرداخت

| مرحله      | شرط پرداخت                                                  | درصد        | مبلغ            |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| پیش‌پرداخت | امضای قرارداد                                               | ۳۰٪         | ۱۰,۷۵۳/۴        |
| M1         | تحویل پایگاه داده GIS، نقشه‌های دورسنجی و فهرست اولیه اهداف | ۲۵٪         | ۸,۹۶۱/۲         |
| M2         | تحویل گزارش میانی کنترل میدانی                              | ۲۵٪         | ۸,۹۶۱/۲         |
| M3         | تحویل گزارش نهایی و فایل‌های GIS                            | ۲۰٪         | ۷,۱۶۸/۹         |
| <b>جمع</b> |                                                             | <b>۱۰۰٪</b> | <b>۳۵,۸۴۴/۷</b> |

## ۱۰ فرض‌ها و موارد خارج از دامنه

### فرض‌ها

### خارج از دامنه

- ضریب منطقه‌ای  $R = 1/11$  (شهرستان قزوین) با جدول رسمی ضرایب منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه تطبیق داده می‌شود و در صورت تفاوت فقط ردیف ۰۲۰۹۰۱ اصلاح می‌شود.
  - افزایش ۳۰٪ نسبت به تعرفه ۱۴۰۴ تا ابلاغ تعرفه رسمی ۱۴۰۵ مبنای است.
  - داده‌های ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوابرد و نقشه‌های زمین‌شناسی موجود توسط کارفرما یا از سازمان زمین‌شناسی تأمین می‌شود.
  - تعداد دقیق اعزام‌های مجدد پس از پایان مرحله دفتری و تعیین اهداف امیدبخش مشخص می‌شود. در این برآورد ۶ اعزام مجدد (تعویض نوبت هر اکیپ حدود هر ۲۰ روز کاری) منظور شده است. هر اعزام مجدد، از جمله اعزام خارج از برنامه به درخواست کارفرما، ۱۵۰ میلیون تومان است.
  - برنامه زمانی و مبلغ پیشنهاد بر پایه شرایط عادی کاری (دسترسی ایمن به محدوده، آب‌وهوای مناسب فصل، دسترسی به شبکه ارتباطی و داده) تنظیم شده است. اثر تورم و رویدادهای خارج از کنترل در بندهای ۱۱ و ۱۲ تعیین تکلیف شده است.
- نمونه‌برداری نظام‌مند و آنالیز آزمایشگاهی
  - برداشت نقشه زمین‌شناسی یا ژئوفیزیک جدید
  - حفاری، ترانشه، چاهک و اکلون
  - پهپاد، LiDAR، هایپراسپکترال هوابرد و خرید داده تجاری ماهواره‌ای
  - برآورد ذخیره یا منبع
  - مالیات‌ها، حق بیمه و عوارض (بند ۱۰-۱)
  - هزینه‌های ناشی از رویدادهای خارج از کنترل (بند ۱۲) مگر در حدودی که همان بند تعیین کرده است

### ۱۰-۱ مالیات، حق بیمه و عوارض (بر عهده کارفرما)

- مشاور شخص حقیقی است و مبلغ پیشنهادی خالص و بدون هیچ‌گونه مالیات، حق بیمه یا عوارضی است. موارد زیر به صورت جداگانه و علاوه بر مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما است و از مبلغ پرداختی به مشاور کسر نمی‌شود:
- مالیات بر ارزش افزوده و هر مالیات، عوارض یا کسورات قانونی مرتبط با قرارداد؛
  - حق بیمه تأمین اجتماعی قرارداد (سهم کارفرما و بخش مربوط به قرارداد) و هر بیمه‌ای که قانون یا کارفرما برای پروژه الزامی کند؛
  - بیمه حوادث و مسئولیت اکیپ‌های میدانی در صورتی که کارفرما یا مراجع ذی‌ربط آن را لازم بدانند؛
  - هزینه مجوزها، استعلام‌ها و تأمین امنیت محل کار در صورت درخواست مراجع رسمی.

### بند تعدیل

در صورت تغییر محدوده، تغییر کیفیت یا فرمت داده‌های ورودی، اضافه‌شدن نمونه‌برداری یا برداشت ژئوفیزیکی، تغییر ضریب منطقه‌ای یا ابلاغ رسمی تعرفه ۱۴۰۵، مبلغ قرارداد از طریق الحاقیه تعدیل می‌شود.

## ۱۱ تورم و تعدیل قیمت

اگر به هر دلیل، از جمله جنگ و ناامنی، قطعی اینترنت و ارتباطات یا شرایط نامساعد آب‌وهوایی، کنترل میدانی از مدت پیش‌بینی‌شده (۲۶ هفته در برنامه پایه) طولانی‌تر شود، قیمت نهایی قرارداد متناسب با تورم دوره تمدید تغییر می‌کند و مبلغ پایه ثابت نمی‌ماند.

- نرخ‌های این پیشنهاد برابر تعرفه ۱۴۰۴ به علاوه ۳۰٪ است و برای اجرای ۶ ماهه (یا ۵ ماهه در برنامه تسریع‌شده) تنظیم شده است. با توجه به نرخ بالای تورم در کشور و نوسان قیمت سوخت، اجاره خودرو، اسکان و دستمزد در طول چند ماه، مبلغ پیشنهاد فقط در شرایط زیر ثابت می‌ماند:
- قرارداد و پیش‌پرداخت حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ این پیشنهاد (اعتبار پیشنهاد) امضا و پرداخت شود؛

- هر قسط طبق جدول بند ۹ حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تحویل مرحله مربوط پرداخت شود؛
- برنامه زمانی بدون تأخیر متناسب به کارفرما یا رویدادهای بند ۱۲ (جنگ، قطعی اینترنت، شرایط آب‌وهوایی و ...) پیش برود.

### نحوه محاسبه تعدیل

اگر هر یک از شرایط بالا رعایت نشود، فقط بخش پرداخت‌نشده یا انجام‌نشده قرارداد از تاریخ پایان مهلت مربوط تا تاریخ پرداخت یا اجرای واقعی، با ضریب زیر تعدیل می‌شود. بخش‌های تحویل‌شده و پرداخت‌شده در موعد مشمول تعدیل نیستند.

$$\text{مبلغ تعدیل‌شده} = \text{مبلغ باقیمانده} \times (\text{شاخص ماه پرداخت} \div \text{شاخص ماه مبنا})$$

- **شاخص:** شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشرشده توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی؛ در صورت توقف انتشار، ضرایب تعدیل رسمی سازمان برنامه و بودجه یا توافق دو طرف.
- **ماه مبنا:** ماه تاریخ این پیشنهاد (مهر ۱۴۰۵).
- **جلوگیری از اعمال مضاعف:** افزایش ۳۰٪ نسبت به تعرفه ۱۴۰۴ بخشی از مبنای قیمت است و دوباره تعدیل نمی‌شود. اگر تعرفه رسمی ۱۴۰۵ ابلاغ شود، تفاوت آن با مبنای پیشنهاد از طریق الحاقیه (بند تعدیل در بخش ۱۰) اعمال می‌شود و تعدیل شاخص فقط بعد از تاریخ مبنای تعرفه جدید محاسبه می‌شود.
- **داده‌های ماهواره‌ای** رایگان هستند؛ بنابراین وابستگی ارزی این پروژه کم است و بخش عمده اثر تورم از دستمزد، خودرو، اسکان و سوخت می‌آید.

**نمونه محاسبه (فرضی، برای درک مقیاس):** اثر تأخیر بر کل مبلغ پیشنهاد (۳۵,۸۴۴/۷ میلیون تومان) در سه سناریوی تورم سالانه. نرخ واقعی طبق شاخص رسمی هر ماه محاسبه می‌شود. در هر خانه، بالا درصد افزایش و پایین مبلغ افزایش به میلیون تومان است. حالت واقعی کمتر است، چون فقط مبلغ باقیمانده تعدیل می‌شود.

| تورم سالانه (فرض) | معادل ماهانه | ۱ ماه تأخیر     | ۲ ماه تأخیر     | ۳ ماه تأخیر      | ۶ ماه تأخیر      |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| ۳۰٪ در سال        | ۲,۲٪         | ۲,۲٪<br>۷۹۲/۳   | ۴,۵٪<br>۱,۶۰۲/۲ | ۶,۸٪<br>۲,۴۲۹/۹  | ۱۴,۰٪<br>۵,۰۲۴/۵ |
| ۴۰٪ در سال        | ۲,۸٪         | ۲,۸٪<br>۱,۰۱۹/۳ | ۵,۸٪<br>۲,۰۶۷/۶ | ۸,۸٪<br>۳,۱۴۵/۶  | ۱۸,۳٪<br>۶,۵۶۷/۳ |
| ۵۰٪ در سال        | ۳,۴٪         | ۳,۴٪<br>۱,۲۳۱/۸ | ۷,۰٪<br>۲,۵۰۶/۰ | ۱۰,۷٪<br>۳,۸۲۴/۰ | ۲۲,۵٪<br>۸,۰۵۵/۹ |

## ۱۲ ریسک‌ها و رویدادهای خارج از کنترل

**جنگ، قطعی اینترنت و ارتباطات و شرایط آب‌وهوایی** نامساعد مهم‌ترین ریسک‌های این پروژه‌اند و هر سه می‌توانند زمان اجرا را طولانی کنند. این پروژه شامل ۱۵۳ اکیپ‌روز کار میدانی در منطقه کوهستانی است؛ بنابراین سلامت اکیپ‌ها و ایمنی دسترسی بر برنامه زمانی مقدم است. رویدادهای زیر و نحوه برخورد با آنها در جدول آمده است.

| رویداد                                                                                                      | اثر بر پروژه                                                                                                        | برخورد پیشنهادی                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>جنگ، درگیری نظامی، ناامنی و محدودیت‌های امنیتی</b><br>(ممنوعیت تردد، ممنوعیت پرواز و پهباد، مجوز نیافتن) | توقف یا لغو اعزام؛ ناامنی جاده‌ها؛ تأخیر در مجوزها؛ <b>قطعی اینترنت و ارتباطات</b> و در نتیجه اختلال در دریافت داده | تغییر ترتیب کارها به نفع کار دفتری؛ تعلیق عملیات میدانی تا رفع محدودیت؛ تمدید برنامه؛ هزینه اعزام مجدد طبق ردیف تبصره فصل ۲ |

|                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرایط آب و هوایی نامساعد<br>(برف، یخبندان، بارش شدید، سیل، مه، گرمای شدید)                                           | ناممکن شدن دسترسی و برداشت؛ برف گیر شدن ارتفاعات محدوده در زمستان؛ روزهای ازدست رفته اکیپ | پایش روزانه پیش بینی هوا؛ برداشت ارتفاعات در فصل مناسب (طبق یادداشت بند ۵)؛ روز نامساعد جزء روزهای مصرف شده اکیپ نیست |
| بلایای طبیعی (زلزله، رانش، ریزش یا مسدود شدن جاده)                                                                   | قطع دسترسی به بخشی از محدوده؛ تغییر محل اسکان                                             | جابه جایی به بخش دیگر محدوده؛ تمدید برنامه به اندازه توقف                                                             |
| کمبود یا محدودیت سوخت، حمل و نقل و برق                                                                               | کاهش روزهای مؤثر اکیپ؛ افزایش هزینه خودرو                                                 | تمدید برنامه؛ افزایش هزینه از طریق تعدیل بند ۱۱                                                                       |
| بیماری همه گیر و محدودیت های بهداشتی                                                                                 | محدودیت تردد و اسکان؛ غیبت نیرو                                                           | جایگزینی نیرو؛ تمدید برنامه                                                                                           |
| تأخیر در تأمین داده یا مجوز دسترسی (داده های سازمان زمین شناسی، استعلام کاداستر، رضایت مالکان، محدوده های حفاظت شده) | تأخیر شروع تحلیل و تهیه فهرست اهداف                                                       | تمدید برنامه؛ در صورت خروج از فصل مناسب، تعدیل طبق بند ۱۱                                                             |
| نوسان شدید قیمت و ارز                                                                                                | افزایش هزینه های اجرا                                                                     | تعدیل طبق بند ۱۱                                                                                                      |

مبلغ پیشنهادی هیچ ذخیره احتیاطی برای این رویدادها ندارد؛ هزینه آنها فقط طبق قاعده های زیر و در صورت وقوع به قرارداد افزوده می شود.

## قاعده های اجرایی

- اعلام:** مشاور رویداد را ظرف ۷۲ ساعت از وقوع، کتبی به کارفرما اعلام می کند و مدرک (گزارش هواشناسی، اعلام مراجع رسمی، گزارش روزانه اکیپ) ارائه می دهد.
- تمدید زمان و تعدیل قیمت:** مدت قرارداد به اندازه مدت وقفه، به علاوه زمان لازم برای بازگشت اکیپ ها، تمدید می شود، جریمه تأخیر ندارد و هزینه های دوره تمدید طبق تورم همان دوره (بند ۱۱) تعدیل می شود. مراحل پرداخت M1 تا M3 با همان جابه جایی تاریخ تحویل جابه جا می شود.
- روز آماده باش:** اگر اکیپ در محل مستقر باشد و کار میدانی به علت آب و هوا یا محدودیت امنیتی یک روز کامل ممکن نباشد، فقط هزینه خودرو و اسکان (ردیف های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۲۰۱) برابر ۳۵/۷۵ میلیون تومان به ازای هر اکیپ در روز پرداخت می شود. دستمزد کارشناسی (ردیف ۰۲۰۹۰۱) برای این روزها دریافت نمی شود و این روزها جزو سقف ۱۵۳ اکیپ روز شمرده نمی شود.
- خروج اضطراری:** اگر به علت خطر جانی یا دستور مراجع رسمی اکیپ ها از محدوده خارج شوند، بازگشت آنها اعزام مجدد محسوب می شود و طبق ردیف تبصره فصل ۲ (۱۵۰ میلیون تومان) محاسبه می گردد.
- وقفه طولانی:** اگر وقفه پیوسته بیش از ۶۰ روز طول بکشد، دو طرف برنامه و مبلغ را با الحاقیه بازنگری می کنند؛ هر دو طرف می توانند قرارداد را فسخ کنند و کار انجام شده تا آن تاریخ با نرخ های این پیشنهاد (و تعدیل بند ۱۱) پرداخت می شود.
- اولویت ایمنی:** مشاور حق دارد برای حفظ جان اکیپ، بدون مسئولیت، کار را متوقف کند. کار دفتری (بخش ۳۹٪ مبلغ) تا حد امکان در این مدت ادامه می یابد.

این بند تعهدی علیه کارفرما یا مشاور ایجاد نمی کند، مگر آن که رویداد خارج از اراده و کنترل معقول طرفین باشد و طرف مدعی، اقدام معقول برای کاهش اثر آن انجام داده باشد.

- تعرفه خدمات زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی سال ۱۴۰۴، ایمیدرو به نیابت از معاونت معدنی وزارت صمت و جامعه مهندسان مشاور ایران
- ایندکس برگه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰,۰۰۰، ۱:۱۰۰,۰۰۰ و ۱:۲۵,۰۰۰، ایندکس صحنه‌های Landsat و ASTER
- چندضلعی محدوده مطالعاتی (فایل KMZ کارفرما)
- شاخص قیمت مصرف‌کننده، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی (مبنای تعدیل بند ۱۱)

---

مهر و امضای کارفرما

---

مهر و امضای مشاور
